

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA** y el supervisor de obra **ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**, y por parte de la empresa **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL** en su carácter de representante legal el **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	EL RODEZNO.
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.001
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	001
Monto contratado	\$249,450.80
Oficio De Aprobación. No.	0716/2023
Fecha Oficio De Aprobación	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Beneficiarios	174 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y termino de obra el 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.


### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$249,450.80 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 20/100 PESOS) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO) FIN	30/10/2023	Del 22/09/2023 Al 30/10/2023	\$249,450.80	\$249,450.80

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1(UNO) FINIQUITO**.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL RODEZNO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
1	PRELIMINARES				\$ 8,998.37				\$ 8,998.37	
HID204-4	DESINSTALACION (EXTRACCION) DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 HP MARCA ALTAMRA KORS R100-30 (6"), CAPAZ DE VENCER UNA CDT=176 M. A UN GASTO DE 2.5 a 2.66 LPS, CONEXION 220V MONFASICO Y/O BIFASICO, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,311.74	\$2,311.74	1.00		1.00	100.00%	\$ 2,311.74
DEM085	DESMANTELADO Y RETIRO DE GEOMEMBANA PLASTICA EN MAL ESTADO DE TANQUE DE 65 M3, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,509.48	\$2,509.48	1.00		1.00	100.00%	\$ 2,509.48
DEM086	DESMANTELADO Y RETIRO DE TELA VINILICA DE ALTA RESISTENCIA EN MAL ESTADO DE TAPA DE TANQUE DE 65 M3, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$706.71	\$706.71	1.00		1.00	100.00%	\$ 706.71
DEM007-1	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y RETIRO DE SALIDA DE TOMA DE PVC HIDRAULICO EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION DE PIEDRA, NI PIESAS ESPECIALES, INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	0.18	\$553.08	\$99.55	0.18		0.18	100.00%	\$ 99.55
PRE141	EXCARFICACION, RENOVACION Y COMPACTACION A MANO DE PLATAFORMA DE TIERRA CONFINADA EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA; A 95% DE SU P.V.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	3.00	\$97.75	\$293.25	3.00		3.00	100.00%	\$ 293.25
PRE107	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALLUD, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	0.49	\$169.69	\$83.15	0.49		0.49	100.00%	\$ 83.15
DEM076	DESMANTELADO DE PIEZAS ESPECIALES DEL TREN DE DESCARGA PARA REHUBICACION, INCL. ALMACENAMIENTO TEMPORAL A CARGO DEL CONTRATISTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	lt	1.00	\$2,994.49	\$2,994.49	1.00		1.00	100.00%	\$ 2,994.49
2.00	ADCUACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 85 M3				\$ 93,783.90					\$ 93,783.90
ALB109	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ACABADO COMUN DE 3RA. CLASE, ASENTADA EN SECO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACARREO, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	0.43	\$2,176.76	\$936.01	0.43		0.43	100.00%	\$ 936.01
HID797	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LIMPEZA DE FOGA DE 4" X 2.30 MTS, CEDULA 40, ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, COPLE GAL. 4", TAPON MACHO GAL. DE 4", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$5,177.81	\$5,177.81	1.00		1.00	100.00%	\$ 5,177.81
HID796-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DESCARGA DE FOGA DE 4" X 1.40 MTS, CEDULA 40, ASTM PARED DE 0.237", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2, ROSACDO INCLUYE PLACA SOLDADA DE 25X25 CMS DE 3/16" DE ESPESOR, Y BRIDA ROSCABLE 2", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$5,164.87	\$5,164.87	1.00		1.00	100.00%	\$ 5,164.87

RVS






MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ALB135 A	LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR. CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CMBRA DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO PULIDO, INCL. LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (15KG/M3), SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m2	15.25	\$1,451.17	\$22,130.34	15.25	15.25	100.00%	\$	22,130.34
ALB129	MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR. CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CMBRA APARENTE DE TERCERA, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, DOBLE PARRILLA AL TRESBOLLO, GANCHOS, BASTONES, ACLADO, ACABADO NORMAL, INCLUYE LOS MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (15 KG/M3), SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m2	2.16	\$1,889.91	\$4,082.21	2.16	2.16	100.00%	\$	4,082.21
HID12 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 40 MILS, 1.0 MM DE ESPESOR, PARA TANQUE DE 85 M3, TERMOFONICIANA A MEDIDA DEL TANQUE, INCL. SOLAPA DE ANCLAJE, SELLADOS ESN SALIDAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$29,428.56	\$29,428.56	1.00	1.00	100.00%	\$	29,428.56
HID12 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE TELA VINILICA DE ALTA RESISTENCIA EXTERIORES PARA TAPA DE TANQUE DE 85 M3, COCIDA PEGADA A MEDIDA DEL TANQUE, INCL. SOLAPA, OJILLES Y CORDELES ELASTICOS DE ANCLAJE, SELLADOS ESN SALIDAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$18,180.90	\$18,180.90	1.00	1.00	100.00%	\$	18,180.90
ALB110	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ACABADO COMUN DE 3RA. CALSE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ELABORADO EN OBRA. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACARREO, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	m3	0.18	\$2,763.88	\$497.50	0.18	0.18	100.00%	\$	497.50
HID511	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANZADO DE 4" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$416.05	\$416.05	1.00	1.00	100.00%	\$	416.05
HID504	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO GALVANZADO DE 4" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$418.06	\$418.06	1.00	1.00	100.00%	\$	418.06
HID437	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" (102 MM) DE DIAMETRO NOMINAL, VASTAGO FUO DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150), CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL, DISCO DE HIERRO DUCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM); TORNILLERIA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR	pza	1.00	\$4,767.15	\$4,767.15	1.00	1.00	100.00%	\$	4,767.15
HID421	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA A/C ROSC. 4" CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$776.35	\$776.35	1.00	1.00	100.00%	\$	776.35
HID412	SUMINISTRO E INSTALACION DE NPLE GALVANZADO LONG. 20 DE 4" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUESTO EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$484.07	\$484.07	1.00	1.00	100.00%	\$	484.07
HID347	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 4" A 2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$354.63	\$354.63	1.00	1.00	100.00%	\$	354.63
HID395	SUMINISTRO E INSTALACION DE NPLE GALVANZADO LONG. 60 CM DE 2" DE DIAMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUESTO EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	2.00	\$199.31	\$398.62	2.00	2.00	100.00%	\$	398.62
HID320	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANZADA DE 2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$199.31	\$199.31	1.00	1.00	100.00%	\$	199.31
HID327	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 2" DE DIAMETRO, CLASE 150, PUESTA EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	\$371.46	\$371.46	1.00	1.00	100.00%	\$	371.46

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large blue signature on the right side of the table.  
 - A blue circle with a signature inside, located below the table.  
 - The initials "R43" written in blue ink to the right of the table.  
 - A large blue "X" mark at the bottom right of the page.

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

3.00 EQUIPO DE BOMBEO (ELECTROMECANICO Y ELECTRICO) Y TREN DE DESCARGA					\$ 86,804.95					\$ 86,804.95
HDRO01	1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP MARCA ALTAMIRA KOR3 R100-30 (6"), CAPAZ DE VENCER UNA CDT=176 M. A UN GASTO DE 2.5 a 2.66 LPS, CONEXIÓN 220V MONOFASICO Y/O BIFASICO. INCLUYE MATERIAL (TRANTES, TUERCAS, CEDASO, ETC.), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$8,525.29	\$8,525.29	1.00	1.00	100.00%	\$ 8,525.29
HDRO1	1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y REINSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP MARCA FRANKLIN LUBRICADO POR AGUA, MODELO MSF6 101230, 1X230 VOLTS. INCLUYE MATERIAL (CABLEADO, SELLOS, MUFAS, ETC.), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$7,537.67	\$7,537.67	1.00	1.00	100.00%	\$ 7,537.67
HDRO2	1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECALIBRACION DE CAJA DE CONTROL PARA MOTOR FRANKLIN DE 10HP, CCF 10230, 230 VOLTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,638.19	\$2,638.19	1.00	1.00	100.00%	\$ 2,638.19
HDRO3	1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REINSTALACIÓN O SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR 10HP. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,473.16	\$4,473.16	1.00	1.00	100.00%	\$ 4,473.16
HDRO4	1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REINSTALACIÓN O SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELEVADOR BIMETALICO 20-25A. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,091.38	\$4,091.38	1.00	1.00	100.00%	\$ 4,091.38
ELE005	1	GESTIÓN Y TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO POR PARTE DE CFE. INCLUYE PAGO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA Y GESTIÓN DE CONTRATO. P.U.O.T.	pza	1.00	\$16,712.53	\$16,712.53	1.00	1.00	100.00%	\$ 16,712.53
ELE007		GESTIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR AUTO CONTENIDO CFE. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$12,829.41	\$12,829.41	1.00	1.00	100.00%	\$ 12,829.41
ELE004	1	UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATO DE SERVICIO (LIVE) Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$16,712.53	\$16,712.53	1.00	1.00	100.00%	\$ 16,712.53
HD092		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA BRIDADO DE 2 1/2" CLASE 150, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI. TIPO TANQUE. INCL. TORNERÍA Y EMPAQUES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P. U. O. T.	pza	1.00	\$5,033.80	\$5,033.80	1.00	1.00	100.00%	\$ 5,033.80
HD008		REHUBICACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE TREN DE DESCARGA EXISTENTES (1 TEE GAL. 2 1/2", 1 VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA DE 1/2" CONEXIONES MENORES, 2 NIFLES GAL. 2 1/2", 3 BRIDAS A/C 2 1/2", 1 VALVULA CHECK 2 1/2", 1 VALVULA DE COMPUERTA V. F. 2 1/2"). INCL. EMPAQUES TIPO FLEXITALIC DE 2 1/2", CORTE DE TUBERÍA Y ROSCADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	lt	1.00	\$2,929.36	\$2,929.36	1.00	1.00	100.00%	\$ 2,929.36
HD119		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA A/C ROSC. 2 1/2" CLASE 150, PUESTO EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	\$581.67	\$1,163.34	2.00	2.00	100.00%	\$ 1,163.34
HD099		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO LONG. 20 CM DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, CED-40, A53, GRADO B, PUESTO EN OBRA, INCLUYE PERMATEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$295.69	\$295.69	1.00	1.00	100.00%	\$ 295.69
HD005	D	SILLETA DE 30X40 CMS Y 60 CM DE ALTURA, CONCRETO F'c= 200kg/cm2. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS, C/ABRAZADERA DE SOLERA DE 3/16"X2", ESPARRAGOS GADO 5 DE 5/8" Y RONDANA/S/ TUERCAS GRADO 5 DE 5/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y ANCLADO A INCAUDO DE ARMADO EN LOSA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,101.99	\$1,101.99	1.00	1.00	100.00%	\$ 1,101.99

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FOLIO: 2838842**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1504/2023**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del día 21 DE DICIEMBRE DEL 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### ENTREGA EMPRESA

  
**ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS


RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

  
**ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA**

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

  
**ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

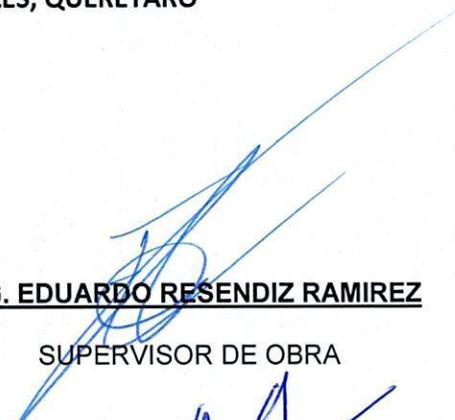  
**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**

SUPERVISOR DE OBRA

  
**LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA**

TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.
